



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4 โครงการ

- 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว
ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
- 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดงคำ (ห้วยแพะ)
ตำบลนาปริง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
- 3 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรอบ
ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
- 4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา



เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ



วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2569 เวลา 08.30 - 12.00 น.



ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกกเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ดาวน์โหลดเอกสาร



กิจการร่วมค้า SPDIE JV

ประกอบด้วย



Supernak Planning And Design Co., Ltd.

บริษัท สุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด



บริษัท วิสวชลกร จำกัด



พื้นที่เป้าหมายประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเผชิญปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนเนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูงและขาดแหล่งกักเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพ กรมชลประทาน**จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างสำรวจและออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 แห่ง ในจังหวัดพะเยา** เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำและชะลอการไหลหลากของน้ำในช่วงน้ำหลากลดความเสียหายต่อพื้นที่ท้ายอ่างและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนพร้อมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นสถานที่นันทนาการและแหล่งท่องเที่ยว อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า SPDIE JV ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด และ บริษัท วิสวชลกร จำกัด ให้ดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4 โครงการ (1) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลสระ อำเภอลี้พะเยา จังหวัดพะเยา (2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดงดำ (ห้วยแพะ) ตำบลนาปรัง อำเภอลี้ จังหวัดพะเยา (3) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรวบ ตำบลลออ อำเภอลี้ จังหวัดพะเยา (4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ ตำบลฝายกวาง อำเภอลี้ จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำและชะลอการไหลหลากของน้ำในช่วงน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดพะเยา

2

ระยะเวลาการดำเนินงาน


กรมชลประทาน ได้กำหนด ระยะเวลาดำเนินงานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4 โครงการ (1) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลสระ อำเภอลี้พะเยา จังหวัดพะเยา (2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดงดำ (ห้วยแพะ) ตำบลนาปรัง อำเภอลี้ จังหวัดพะเยา (3) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรวบ ตำบลลออ อำเภอลี้ จังหวัดพะเยา (4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ ตำบลฝายกวาง อำเภอลี้ จังหวัดพะเยา **จำนวน 540 วัน** โดยเริ่มปฏิบัติงาน **1 พฤษภาคม 2569** สิ้นสุดสัญญา **วันที่ 22 ตุลาคม 2570**





3

ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

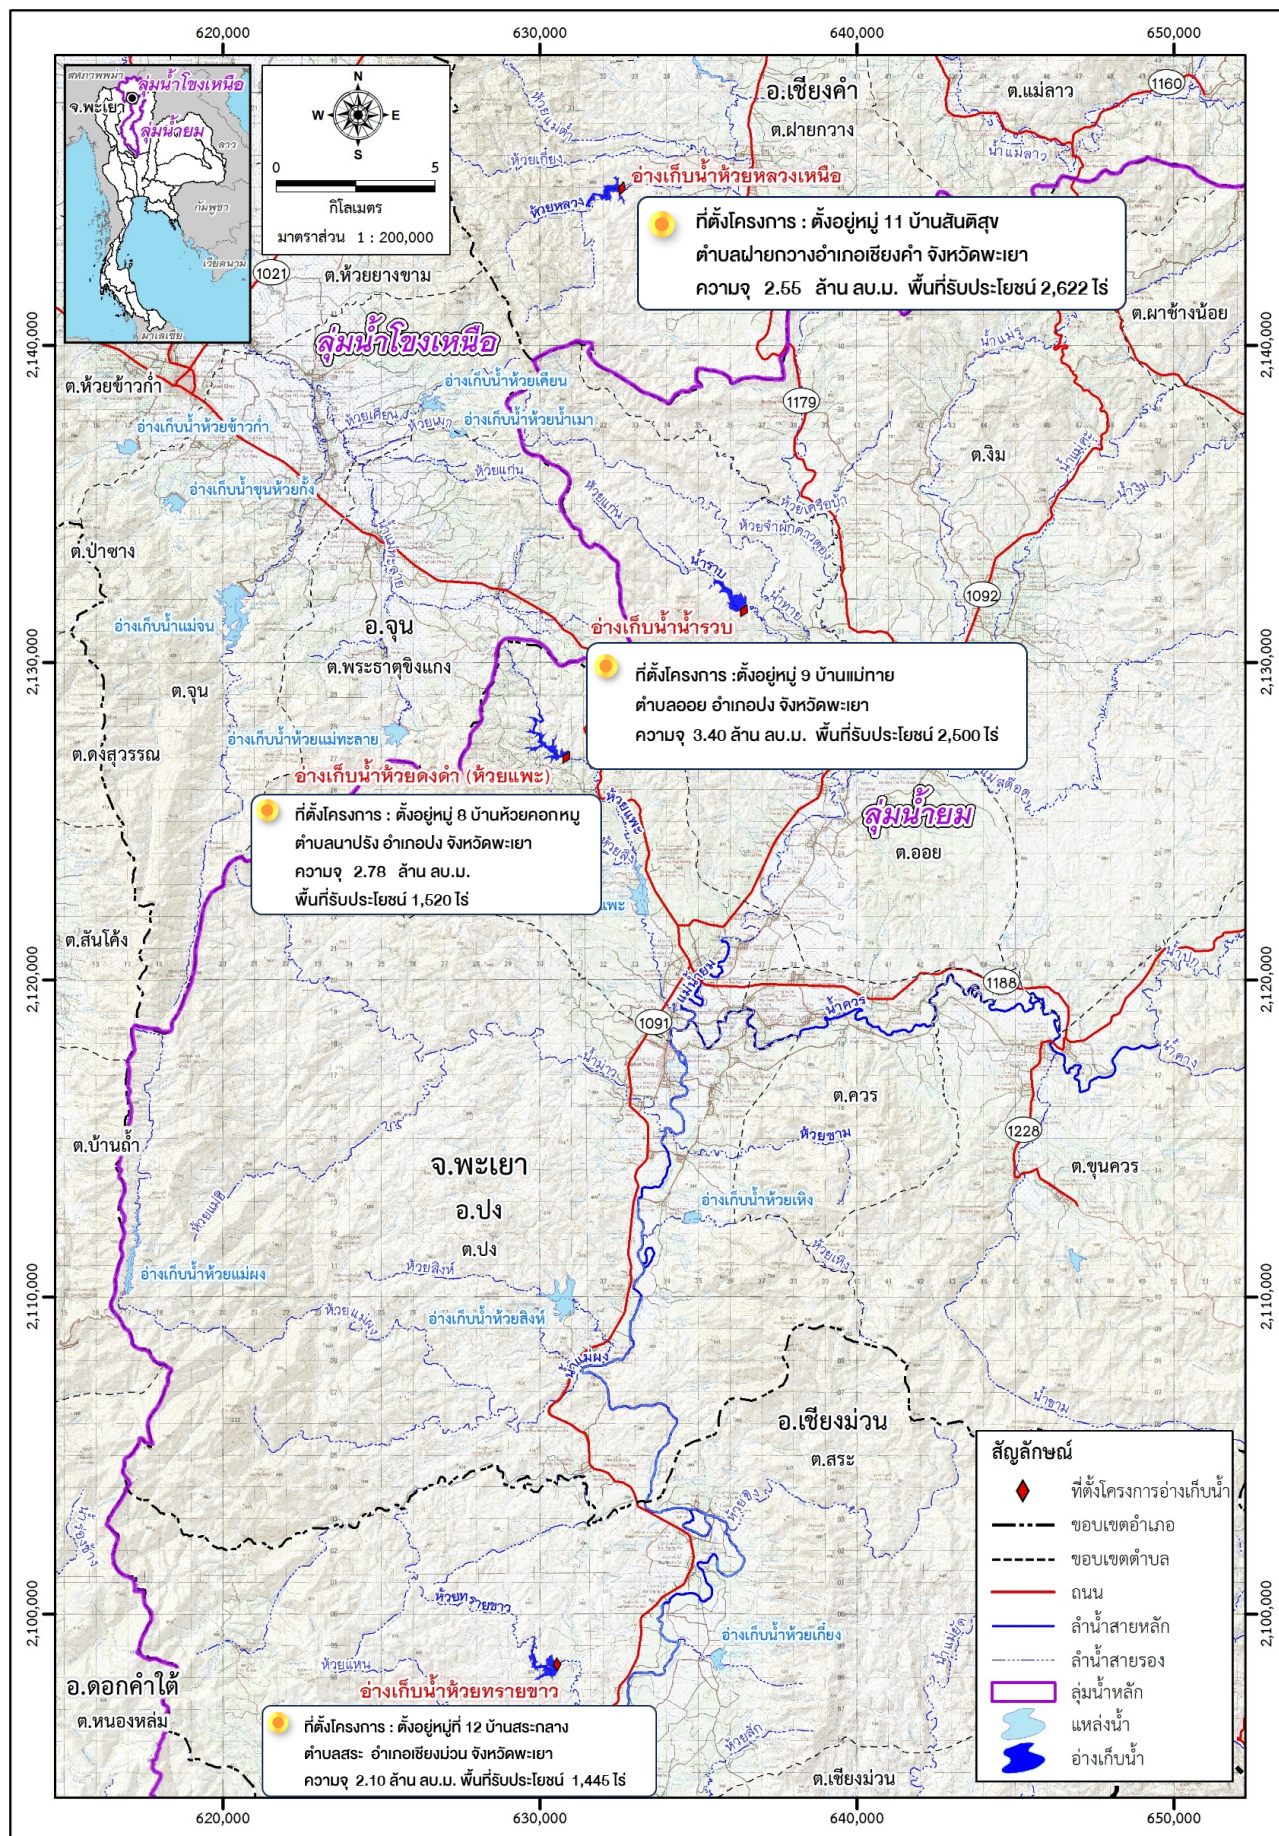


รวม 10.83 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่รับประโยชน์รวม 8,087 ไร่



4

ลักษณะโครงการ (ต่อ)

4.2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคดดำ (ห้วยแพะ)

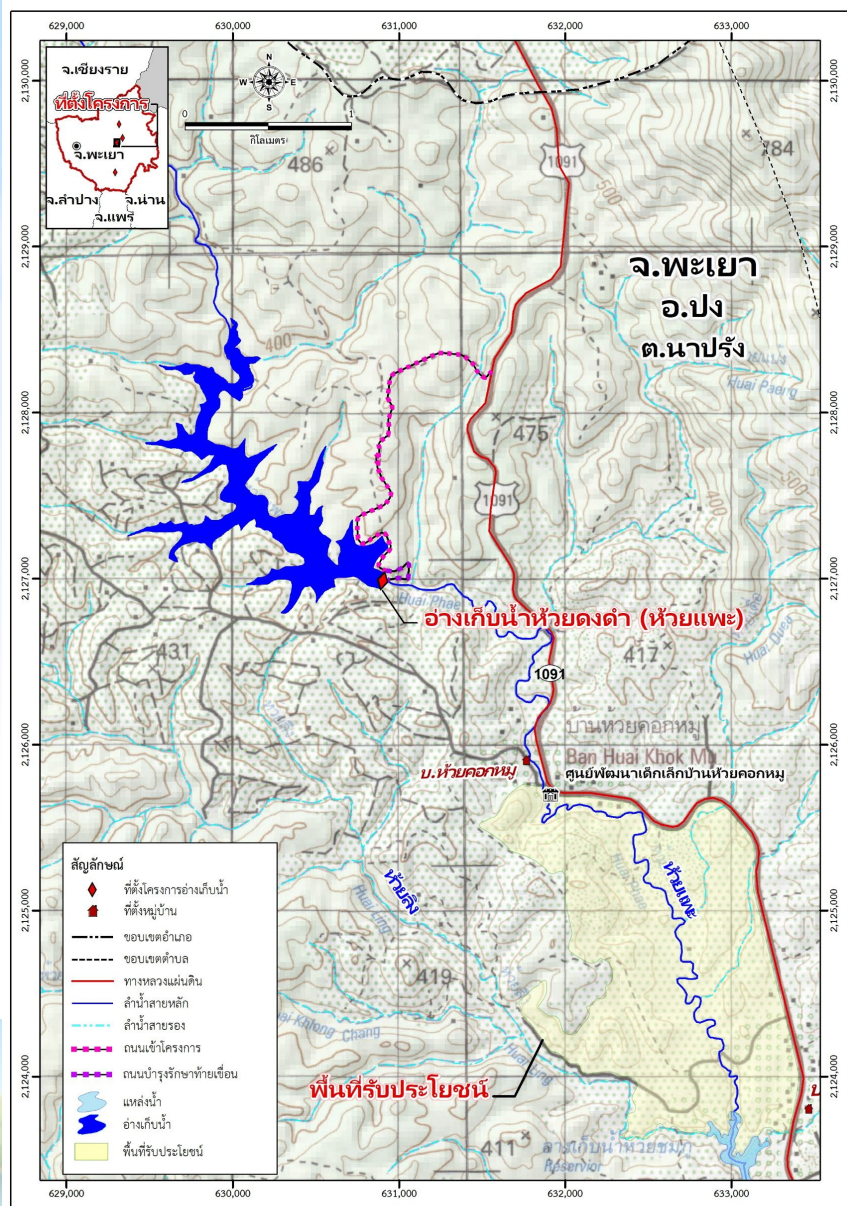

พื้นที่รับประโยชน์

- พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ 1,520 ไร่

ที่ตั้งโครงการ



- ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านห้วยคดดำ ตำบลนาปรัง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลักษณะโครงการ



จากรายงานการศึกษาวางโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคดดำ (ห้วยแพะ) ตำบลนาปรัง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (กรมชลประทาน, 2566)

เขื่อน และ อ่างเก็บน้ำ

- ชนิดเขื่อน "เขื่อนดิน"
- พื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำ 9.09 ตร.กม.
- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 3.45 ล้าน ลบ.ม.
- ระดับน้ำสูงสุด +383.95 ม.(ร.ท.ก.)
- ระดับน้ำเก็บกัก +382.45 ม.(ร.ท.ก.)
- ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 3.43 ล้าน ลบ.ม.
- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 2.78 ล้าน ลบ.ม.
- ความสูงเขื่อน 27.45 ม.

อาคารทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)

- ที่ตั้ง ฝั่งขวาของเขื่อน
- ชนิด ฝายสันนูน (Ogee Crest)
- ลักษณะ แนวตรง (รับน้ำด้านข้าง)
- ระดับสันฝาย +382.45 ม.(ร.ท.ก.)
- ความยาวสันฝาย 20.00 ม.


อาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

- ที่ตั้ง ฝั่งซ้ายของเขื่อน
- ชนิด ท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีต
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.

พื้นที่องค์ประกอบโครงการบางส่วนอยู่ใน เขตพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่จัดการทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วย

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม (ป่าโซน E)
- พื้นที่ ส.ป.ก.
- ป่า คทช. (ป่าแม่ยม)

4.3 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรวบ

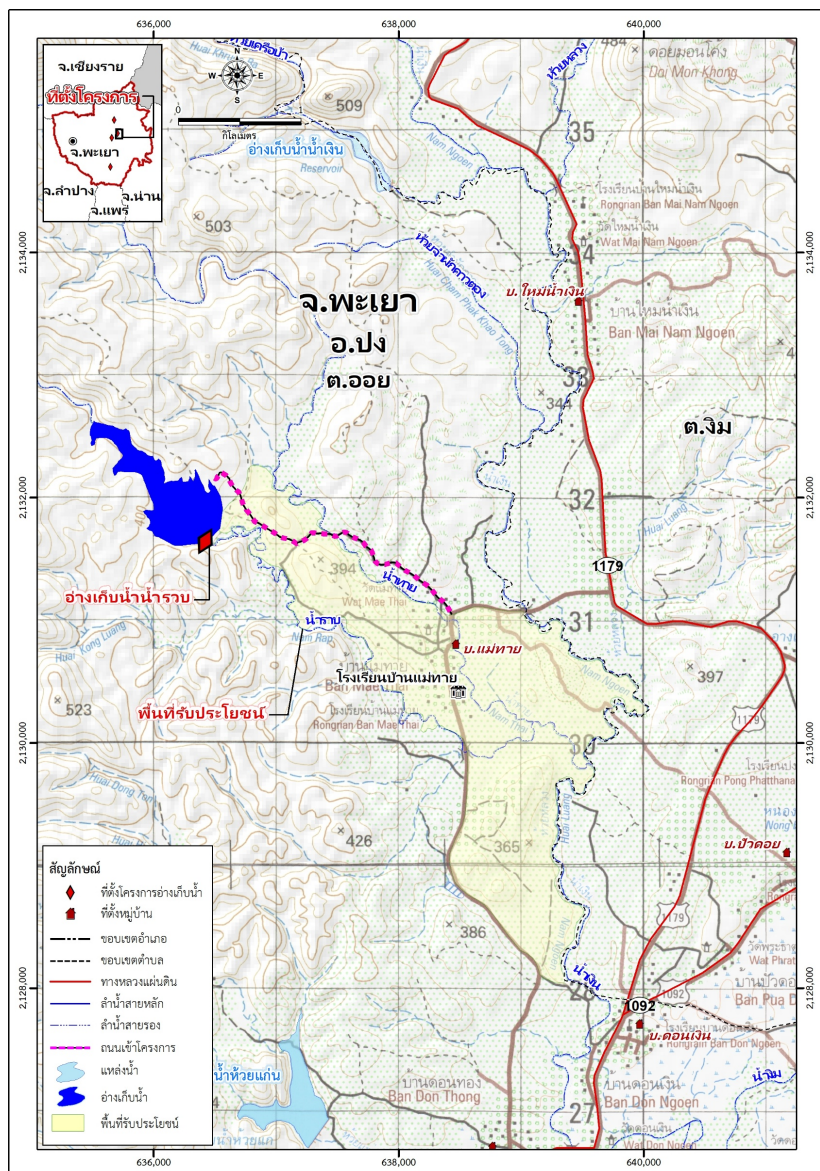

☀️ **พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ** 2,500 ไร่



เงื่อนไข และ อ่างเก็บน้ำ

ชนิดเขื่อน	“เขื่อนดิน”
พื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำ	11.00 ตร.กม.
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี	4.20 ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด	+383.50 ม. (ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกัก	+382.00 ม. (ร.ท.ก.)
ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด	4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก	3.40 ล้าน ลบ.ม.
ความสูงเขื่อน	24.00 ม.

ที่ตั้ง	ฝั่งซ้ายของเขื่อน
ชนิด	ฝายสันมน (Ogee Crest)
ลักษณะ	แนวตรง (รับน้ำด้านข้าง)
ระดับสันฝาย	+382.45 ม.(รทก.)
ความยาวสันฝาย	20.00 ม.

- ที่ตั้ง ผังซ้ายของเพื่อน
- ชนิด ท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีต
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.


4. พื้นที่ ส.ป.ก.



4

ลักษณะโครงการ (ต่อ)

4.4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ

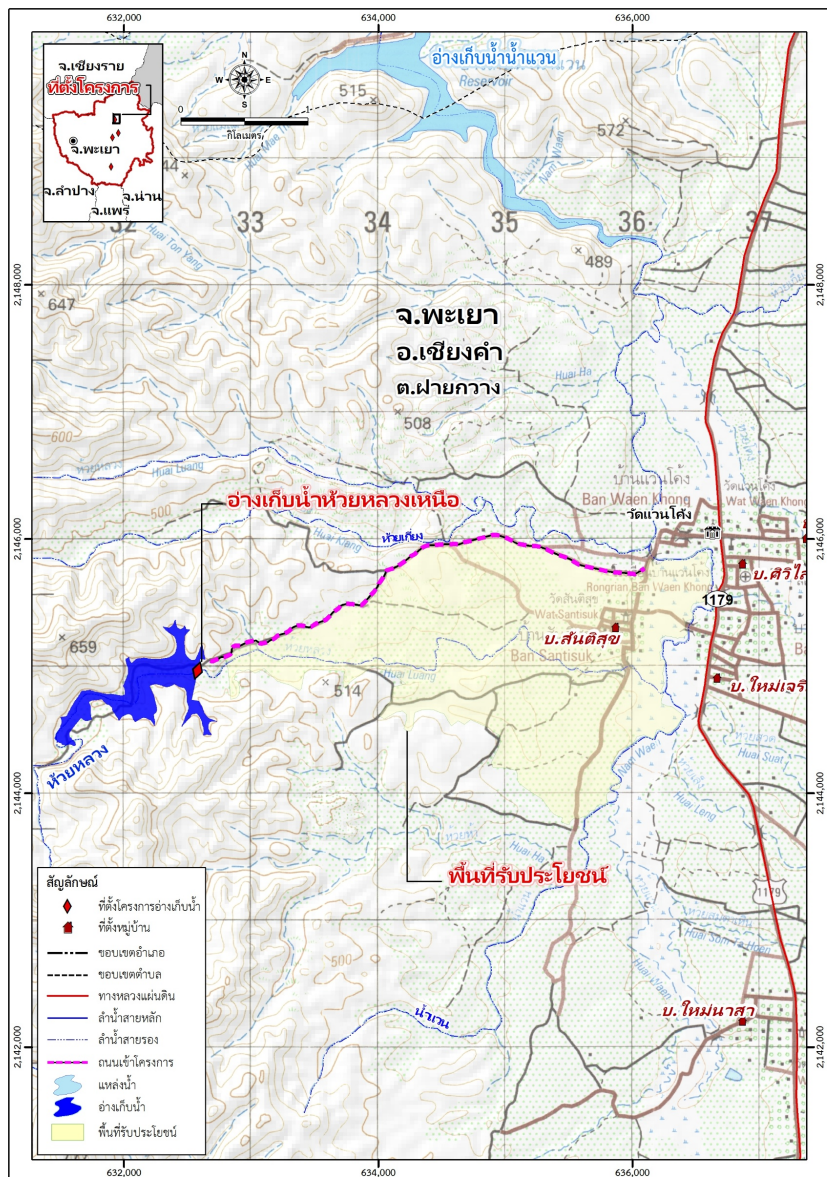

ที่ตั้งโครงการ



- ตั้งอยู่หมู่ 11 บ้านสันตสุข ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ลักษณะโครงการ



จากรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ จังหวัดพะเยา (กรมชลประทาน, 2564)

เขื่อน และ อ่างเก็บน้ำ

- ชนิดเขื่อน “เขื่อนดิน”
- พื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำ 19.70 ตร.กม.
- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 6.15 ล้าน ลบ.ม.
- ระดับน้ำสูงสุด +492.00 ม. (ร.ท.ท.)
- ระดับน้ำเก็บกัก +491.50 ม. (ร.ท.ท.)
- ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 2.72 ล้าน ลบ.ม.
- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 2.55 ล้าน ลบ.ม.
- ความสูงเขื่อน 22.00 ม.

อาคารทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)

- ที่ตั้ง ฝั่งซ้ายของเขื่อน
- ชนิด ฝายสันมน (Ogee Cres)
- ลักษณะ แนวตรง (รับน้ำด้านข้าง)
- ระดับสันฝาย +491.50 ม. (ร.ท.ท.)
- ความยาวสันฝาย 60.00 ม.

อาคารก่อสร้างปล่อยน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

- ที่ตั้ง ฝั่งขวาของเขื่อน
- ชนิด ท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีต
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.


พื้นที่องค์ประกอบโครงการบางส่วนอยู่ใน เขตพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่จัดการทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วย

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
2. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแวนและป่าห้วยไคร้ (ป่าโซน E และ ป่าโซน C)
3. ป่า คทช. (ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้)



5


ผลประโยชน์โครงการ

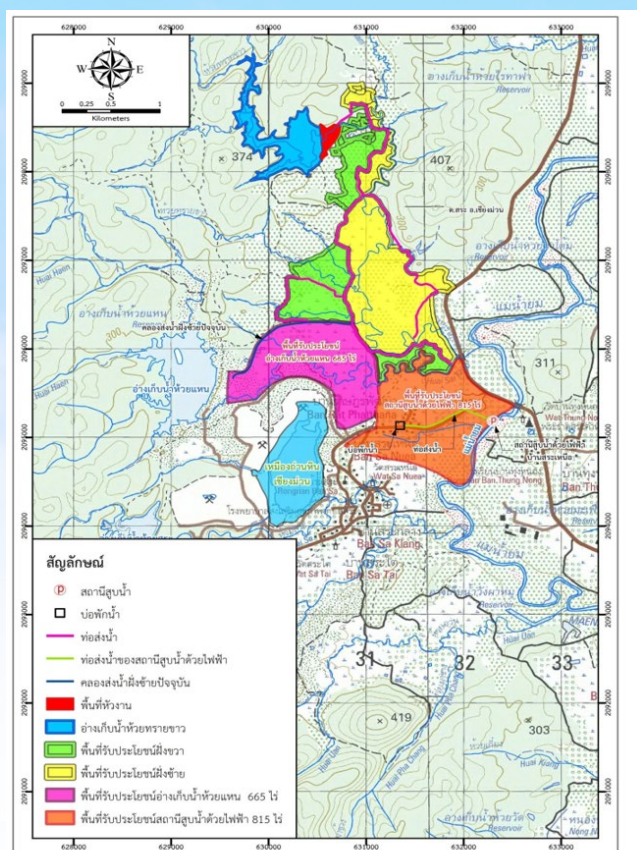

ที่มา : ทรัพยากร, 2567

1 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว

- พื้นที่รับประโยชน์ 1,445 ไร่
- ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตร 1,331 ไร่
- ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 6 หมู่บ้าน
ในตำบลสระ อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา
 - หมู่ที่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้
 - หมู่ที่ 3 บ้านสระเหนือ
 - หมู่ที่ 4 บ้านสระใต้
 - หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์พัฒนา
 - หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าพัฒนา
 - หมู่ที่ 12 บ้านสระกลาง
- ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 105,000 ลบ.ม./ปี

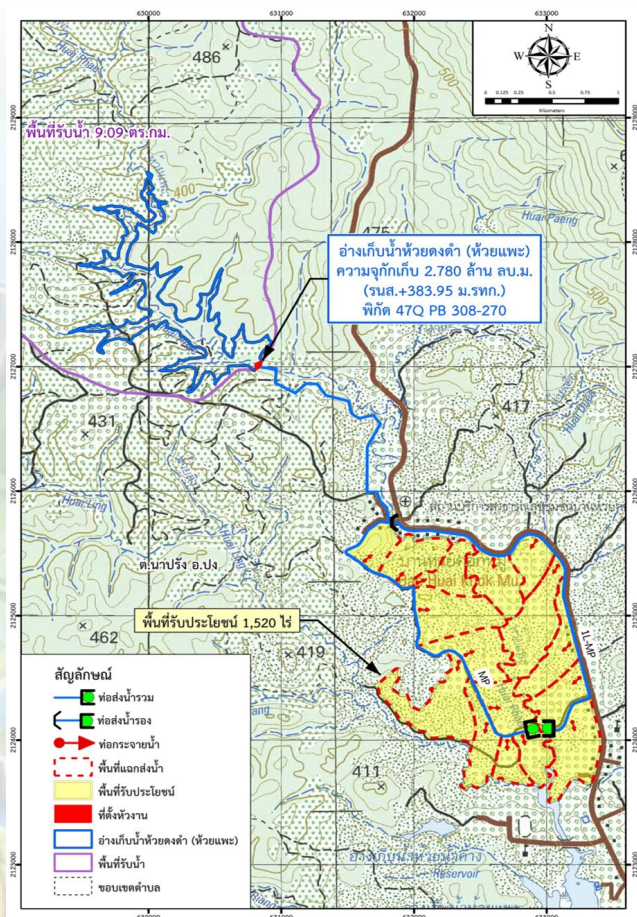


2 อ่างเก็บน้ำห้วยดงคำ (ห้วยแพะ)

- พื้นที่รับประโยชน์ 1,520 ไร่
- ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตร 1,356 ไร่
- ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 หมู่บ้าน
ในตำบลนาปรัง อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา
 - หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแม่แดง
 - หมู่ที่ 8 บ้านคอกหมู
- ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 33,000 ลบ.ม./ปี



5

ผลประโยชน์โครงการ (ต่อ)

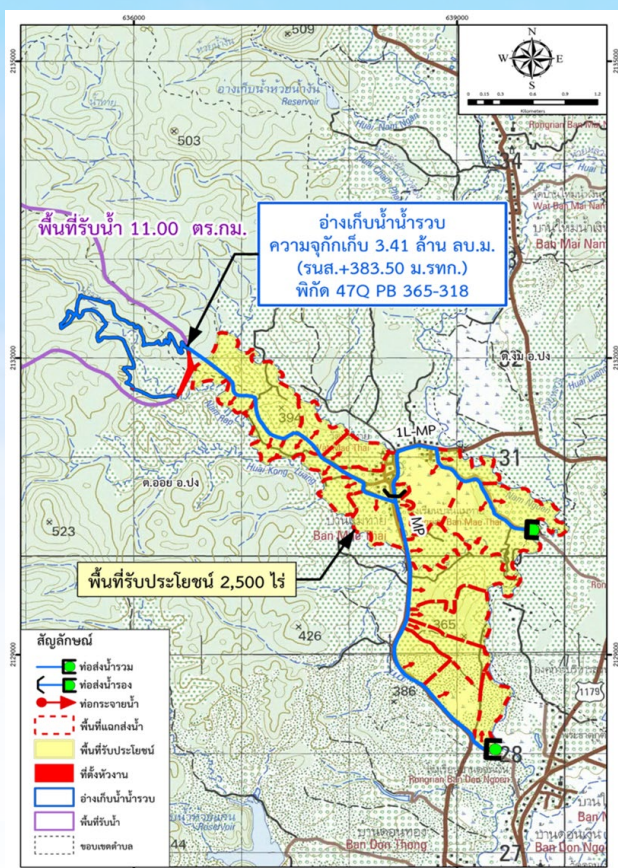

3 อ่างเก็บน้ำรวบ

- พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่
- ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตร 2,187 ไร่
- ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 หมู่บ้าน
ใน 2 ตำบล อำเภออง จังหวัดพะเยา
 - ตำบลออย
 - หมู่ที่ 9 บ้านแม่ทาย
 - ตำบลจิม
 - หมู่ที่ 13 บ้านปัวดอย
- ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 20,000 ลบ.ม./ปี

4 อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ

- พื้นที่รับประโยชน์ 2,622 ไร่
- ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตร 2,247 ไร่
- ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 หมู่บ้าน
ในเทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา
 - หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง
 - หมู่ที่ 11 บ้านสันตสุข
- ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 308,000 ลบ.ม./ปี

สรุปภาพรวมพื้นที่รับประโยชน์
ของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 โครงการฯ

รวม 8,087 ไร่



6

กิจกรรมเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



10 มิถุนายน 2569



10 มิถุนายน 2569



10 มิถุนายน 2569



10 มิถุนายน 2569

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569

คณะผู้แทนกรมชลประทาน นำโดย นายอุดมศักดิ์ สิริสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา นายธงชัย ทิจจคนารักษ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 และ นายอานนท์ อินทรประสาท ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย คณะผู้แทนกิจการร่วมค้า SPDIE JV ลงพื้นที่เข้าพบ นางสาวอรภา ไล่หวัระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

คณะผู้แทนกรมชลประทาน นำโดย นายพรหมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วม และ นายศิริพงษ์ จิตธิพิทย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วย คณะผู้แทนกิจการร่วมค้า SPDIE JV ลงพื้นที่เข้าพบหารือร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ เพื่อนำเสนอความเป็นมา ลักษณะโครงการ เบื้องต้น และแผนการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ เพื่อจะนำไปใช้ประกอบการสำรวจออกแบบโครงการ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

เข้าพบนายอำเภอเชียงม่วน



10 มิถุนายน 2569

เข้าพบปลัดอำเภอเชียงคำ



11 มิถุนายน 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ



11 มิถุนายน 2569

ที่ว่าการอำเภอปง



11 มิถุนายน 2569

เข้าพบรองนายกเทศบาลตำบลฝายกวาง



12 มิถุนายน 2569

เข้าพบหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ในพื้นที่โครงการ

สำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำเข้าพบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



12 มิถุนายน 2569



12 มิถุนายน 2569

เข้าพบสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)



12 มิถุนายน 2569



12 มิถุนายน 2569

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผู้แทนโครงการชลประทานพะเยา และผู้แทนสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้แทนกิจการร่วมค้า SPDIE JV ได้เข้าพบ นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน และเข้าพบ นายเจษฎา เงินทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมด้วย นายธีรภาพ ปุสธรรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูาง และ นายวรฤทธิ์ ไซยสาร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ



แผนปฏิบัติงานโครงการ มีระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน



เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม 2569



สิ้นสุดสัญญา 22 ตุลาคม 2570



ลำดับ ที่	กิจกรรม	เดือนที่																	
		(วัน)	1 1 พ.ค. 69 30 พ.ค. 69	2 31 พ.ค. 69 29 มิ.ย. 69	3 30 มิ.ย. 69 29 ก.ค. 69	4 30 ก.ค. 69 28 ส.ค. 69	5 29 ส.ค. 69 27 ก.ย. 69	6 28 ก.ย. 69 27 ต.ค. 69	7 26 พ.ย. 69 27 พ.ย. 69	8 26 ธ.ค. 69 27 ธ.ค. 69	9 25 ม.ค. 70 27 ม.ค. 70	10 26 ก.พ. 70 24 ก.พ. 70	11 25 มี.ค. 70 26 มี.ค. 70	12 25 เม.ย. 70 26 เม.ย. 70	13 25 พ.ค. 70 26 พ.ค. 70	14 24 มิ.ย. 70 25 มิ.ย. 70	15 24 ก.ค. 70 25 ก.ค. 70	16 23 ส.ค. 70 24 ส.ค. 70	17 23 ก.ย. 70 22 ต.ก. 70
1	การวางแผนงาน การรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510
	- งานวางแผน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายคนทำงาน																		
	- งานรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการศึกษาดังกล่าว																		
	- ตรวจสอบพื้นที่โครงการกับข้อมูลจากด้านสิ่งแวดล้อม																		
2	กำหนดขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																		
	และประสานงานกับเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน รอฟผลการพิจารณาขออนุญาต																		
3	งานทบทวนข้อมูลโครงการ จัดทำแนวคิดและเกณฑ์การออกแบบ																		
	- งานทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ																		
	- งานทบทวนข้อมูลงานสำรวจด้านวิศวกรรม																		
	- งานทบทวนลักษณะความเหมาะสมด้านวิศวกรรม																		
	- งานทบทวนลักษณะความเหมาะสมของโครงการ																		
	- จัดทำแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design)																		
	- จัดทำเกณฑ์กำหนดในการออกแบบ (Design Criteria)																		
4	งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศเพิ่มเติม																		
5	งานสำรวจธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์/แหล่งวัสดุก่อสร้าง เพิ่มเติม																		
	- งานเจาะสำรวจและทดสอบธรณีวิทยา																		
	- งานเจาะสำรวจทดสอบปฐพีกลศาสตร์ฐานราก/แหล่งวัสดุก่อสร้าง																		
6	งานออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบ																		
	- จัดทำแบบร่างทั่วไป																		
	- งานออกแบบและจัดทำแบบต้นร่างรายละเอียด																		
	- คำนวณออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบทางด้านชลศาสตร์																		
	- คำนวณออกแบบด้านโครงสร้าง																		
	- คำนวณออกแบบถนนบำรุงรักษาเขื่อน ถนนเข้าตัวงาน และถนนบนสันเขื่อน																		
	- คำนวณออกแบบด้านไฟฟ้า-เครื่องกล																		
	- จัดทำแบบแปลนดินฉบับกระดาษ (ขนาด A1)																		
7	งานจัดทำ Spec. และ BOQ																		
	- จัดทำรายการปริมาณงานก่อสร้าง (BOQ) และประมาณราคาก่อสร้าง																		
	- จัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications)																		
8	จัดพิมพ์แบบท่อนิตแล้วและจัดเก็บข้อมูลเอกสาร																		
9	การจัดทำคู่มือ																		
	- คู่มือการบริหารจัดการน้ำของโครงการ																		
	- คู่มือการบริหารจัดการงานก่อสร้าง																		
10	งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน																		
	- การปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ																		
	- จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ																		
	- ชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงข้อมูลฯ ครั้งที่ 1																		
	- ชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงข้อมูลฯ ครั้งที่ 2																		
	- จัดกิจกรรมตรวจติดตามโครงการ																		
	- จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ																		
	- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านสื่อประเภทต่างๆ																		

ระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรมรอง



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4 โครงการ

1

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว

ตำบลสระ อำเภอลี้ จังหวัดพะเยา

2

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดงคำ (ห้วยแพะ)

ตำบลนาปริง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

3

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรวบ

ตำบลลออ อำเภอบึง จังหวัดพะเยา

4

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ

ตำบลฝายกวาง อำเภอลี้ จังหวัดพะเยา

เสนอโดย

กิจการร่วมค้า SPDIE JV

SP&D

Suparek Planning And Design Co., Ltd.

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด



บริษัท วิสัชชลกร จำกัด

• อำเภอแม่ใจ

• อำเภอเมืองพะเยา

• อำเภอดอกคำใต้

• อำเภอเชียงม่วน

• อำเภอกุซาง

• อำเภอเชียงคำ

• อำเภอเมือง
